

CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Alejandro Yujra
Caio Araújo
João Vitor Nunes
Tiago Molero
Victor Ortiz
Vinicius Rocha

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA

São Paulo/SP Dezembro/2017.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Trabalho apresentado como exigência Para obtenção do título TÉCNICO DE INFORMÁTICA.

São Paulo/SP Dezembro/2017

Sumário

1. OBJETIVO	5
2. JUSTIFICATIVA	5
3. DEFINIÇÃO DO ESCOPO	6
4. CANVAS	7
5. ANÁLISE DE REQUISITOS	8
5.1 REQUISITOS FUNCIONAIS (DESKTOP)	8
5.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (DESKTOP)	8
6. ANÁLISE DE STAKEHOLDERS	9
7. ANÁLISE DE RISCO	10
8. CUSTOS	11
8.1 CUSTO DE MÃO DE OBRA	11
8.2 ANÁLISE DE CUSTO	11
9. CRONOGRAMA	12
10. EAP	13
10.1 EAP GERAL	13
10.2 EAP DETALHADO	14
10.3 EAP GERAL - AGOSTO	15
10.4 RELATORIO DE PROGRESSO AGOSTO	15
10.5 EAP DETALHADO – AGOSTO	16
10.6 EAP GERAL – SETEMBRO	17
10.7 RELATORIO DE PROGRESSO SETEMBRO	17
10.8 EAP DETALHADO - SETEMBRO	18
10.9 EAP GERAL – OUTUBRO	19
10.10 EAP DETALHADO – OUTUBRO	20
11. RELATORIO DE FREQUÊNCIA	21
12. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	22
12.1 CASO DE USO	22
12.2 NARRATIVA DE CASO DE USO	23
12.2.1 CSU01/CADASTRAR	23
12.2.2 CSU02/LISTAPRODUTO	24
12.2.3 CSU03/LISTADISTRIBUIDOR	25
12.2.4 CSU04/ALTERARDISTRIBUIDOR	26
12.2.5 CSU05/ALTERARPRODUTO	27
12.2.6.CSU06/CADASTRODISTRIBUIDOR	28

12.2.7 CSU07/EXCLUIRDISTRIBUIDOR	29
12.2.8 CSU08/EXCLUIRPRODUTO	30
12.2.9 CSU09/PESQUISARPRODUTO	31
12.2.10 CSU10/PESQUISARDISTRIBUIDOR	32
12.2.11 CSU11/REGISTRARMOVIMENTO	33
12.3 MER(MODELO ENTIDADE DE RELACIONAMENTO)	34
12.4 DIAGRAMA DE CLASSE	35
ANEXOS	36
ANEXO I –PROTÓTIPO CADASTRO DE DISTRIBUIDOR	37
	37
ANEXO II –PROTÓTIPO CADASTRO DE MOVIMENTO	38
ANEXO III –PROTÓTIPO CADASTRO DE PRODUTO	39
ANEXO IV –PROTÓTIPO LISTA DE MOVIMENTAÇÃO	40
ANEXO V –PROTÓTIPO LISTA DE DISTRIBUIDOR	41
ANEXO VI –PROTÓTIPO LISTA DE PRODUTO	42
ANEXO VIII –PROTÓTIPO TELA INICIAI	43

1. OBJETIVO

Implementar um RFID tag em todos os produtos para agilizar entrada e saída de estoque, e saber a origem de um produto que for comprado de qualquer loja (para qual distribuidor vendemos o produto que foi parar na loja de suplementos.

2. JUSTIFICATIVA

A empresa **PhotonGroup** procura um controle estoque automatizado com um sistema RFID. A empresa encontra dificuldades ao querer saber por quanto foi vendido um produto para um determinado distribuidor.


O sistema permitirá que a empresa possa ter um controle total dos seus produtos sabendo por quanto foi vendido o produto X para o distribuidor Y.

3. **DEFINIÇÃO DO ESCOPO**

A **PhotonGroup** através do sistema desktop poderá ter acesso a todos os produtos que entraram e saíram da empresa, sabendo assim por quanto aquele produto saiu e por quanto ele deverá ser vendido de acordo com o contrato estabelecido com o distribuidor. Este controle será feito pela tecnologia RFID onde nos produtos serão colocados TAGS que serão reconhecidas por um leitor quando esse for aproximado das TAGS. Após feito o reconhecimento, o usuário poderá realizar no ato do cadastro das TAGS, o nome do produto para saber assim qual produto está entrando ou saindo da empresa.

Com isso ele terá sempre o acesso a esses produtos cadastrados, quando ele quiser saber sobre aquele produto é só ele passar a TAG no leitor e o sistema mostrará a ele todos os dados daquele produto. Tendo assim um controle de estoque de todos seus produtos além de saber para qual distribuidor está vendendo o produto.

4. CANVAS

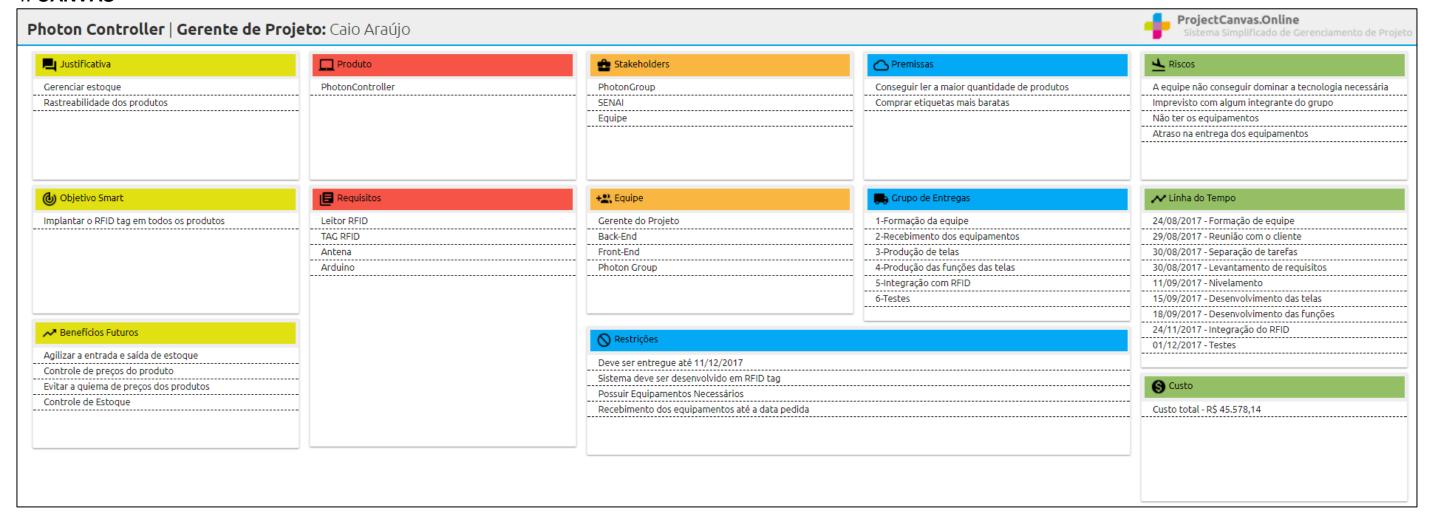

5. ANÁLISE DE REQUISITOS

5.1 REQUISITOS FUNCIONAIS (DESKTOP)

	Requisitos Funcionais									
ID	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA	Explicação							
RF001	Cadastro de produto	Alta	O cadastro será associado ao tipo do produto.							
RF002	Lista de Distribuidor	Alta	O software ira listar os distribuidores , disponibilizando as seguintes funções alterar, excluir e pesquisar.							
RF003	Cadastro de distribuidor	Alta	O software ira guardar para qual distribuidor o produto esta sendo vendido.							
RF004	Lista de Movimento	Alta	O software guardara todas as entradas e saidas que houver.							
RF005	Alterar Produto	Alta	No software o usuario podera alterar o produto.							
RF006	Alterar Distribuidor	Alta	No software o usuario podera alterar o distribuidor.							
RF007	Excluir Distribuidor	Alta	No software o usuario podera remover o produto do sistema.							
RF008	Excluir Produto	Alta	No software o usuario podera remover o produto do sistema.							

5.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (DESKTOP)

	Requisitos Não Funcionais										
ID	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA	Explicação								
RF001	Banco de dados relacional	Alta	Guardara todos os dados.								
RF002	Linguagem C e Java.	Alta O software será desenvolvido nessas linguago									
RF003	F003 Interface intuitiva Média		Interface simples e facil de usar.								
RF004	Tempo de resposta	Média	A Tecnologia que vai ser utilizada tem de suportar uma quantidade de 200 dados p/segundo.								
RF005	Tempo de desenvolvimento	Alta	Não deve passar de 4 meses.								
RF006	Identificação das etiquetas	dentificação das etiquetas Alta As etiquetas devem ser identicadas pel									
RF007	Sistema	Alta	O sistema deve funcionar em desktop.								
RF008	RFID tag	Média	As tags devem ser coladas nos produtos								

6. ANÁLISE DE STAKEHOLDERS

Stakeholders	Positivas	Negativas	Grau de Poder	Grau de Interesse	Atitude
Equipe Técnica da Photon Group	informações para o desenvolvimento do projeto	Problemas com a comunicação	2	8	Manter informado
SENAI	Disponibilidade de ferramentas e condutores	Data de entrega	10	10	Gerenciar
Equipe Desenvolvedora	Bom relacionamento	Desentendimentos, faltas, atrasos	5	10	Manter Informado
Photon Group	Recebimento de informações	Dificuldades na comunicação	10	10	Gerenciar

	Poder x Interesse										
10							SENAI.				
9											
8		Mant	er Sati:	sfeito			G	erenci	ar		
7											
6						Photon Group.					
5						Ec	quipe D	esenvo	olvedor	a.	
4											
3		N	lonitor	ar		Manter Informado					
2						Fautine Técnice de Disease					
1							Equipe Técnica da Photon.				
PxI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

7. ANÁLISE DE RISCO

ID	Risco	Descrição	PXI	VME	Estratégia	Tipo	Ação	Custo Total	Custo Contigencia
4	Desenvolvimento Back-End	Não dominar a tecnologia necessaria para o desenvolvimento.	Alto x Muito Alto	20%	Mitigar	Ameaça	Ter um tempo para nivelamento da tecnologia.	R\$18.816,00	R\$3.136,00
5	Desenvolvimento Front- End	Não dominar a tecnologia necessaria para o desenvolvimento.	Alto x Muito Alto	20%	Mitigar	Ameaça	Ter um tempo para nivelamento da tecnologia.	R\$9.120,00	R\$1.520,00
1	Iniciação	Perder os documentos.	Muito baixo x Alto	4%	Mitigar	Ameaça	Armazena-los no Google Drive, Pendrive, Computadores. Possuindo assim metódos que amenizem os atrasos	R\$11.648,00	R\$448,00
2	Planejamento	Ter problemas na geração da documentação	Baixo x Muito Alto	10%	Mitigar	Ameaça	Procurar ter todos os membros do grupo no desenvolvimento juntamente com o lider.	R\$5.764,00	R\$524,00
7	Finalização	Ter atrasos relacionado ao que foi planejado.	Médio x Muito Alto	15%	Mitigar	Ameaça	Realização das tarefas de acordo com as datas do cronograma.	R\$19.780,00	R\$250,00
3	Execução	Dificuldade em encontrar materiais compativeis.	Médio x Muito Alto	15%	Mitigar	Ameaça	Procurar auxilio tecnico de profissionais.	R\$30.314,00	R\$3.954,00
6	Integração	Ter erros constantes.	Alto x Muito Alto	20%	Mitigar	Ameaça	Uma comunicação mais intensa entre a equipe de Front-End e Back-End	R\$44.028,00	R\$7.338,00

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO									
MUITO ALTO									
ALTO					[5] [4] [6]				
MÉDIO					[7] [3]				
BAIXO					[2]				
MUITO BAIXO				[1]					
PXI	MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	MUITO ALTO				

8. CUSTOS

8.1 **CUSTO DE MÃO DE OBRA**

Função	Membros	Valor Total		
Desenvolvedor Back-end	João Vitor, Tiago e Vinicius	R\$ 240,00 p/ dia, por pessoa		
Desenvolvedor Front-end	Alejandro e Victor	R\$ 200,00 p/ dia, por pessoa		
Gerente de Projeto	Caio Araújo	R\$ 280,00 p/ dia		

8.2 ANÁLISE DE CUSTO


	Custo de Mão de obra	
R\$		114.080,00
	Custo de Contigencia	
R\$		17.170,00
	Custo Total	
R\$		131.250,00

9. **CRONOGRAMA**


	ONOGRAMA	D	1-1-1-	F' B'	Fi B1	D	Haddada da Tarballa		C
	Nome	Duração	Inicio	Fim Previsto	Fim Real	Processador	Unidade de Trabalho	nc.	Custo
	Projeto	73 Dias	24/07/2017	11/12/2017	20/00/2017		Al-1		114.080,00
1	Iniciação	28 Dias	24/07/2017	30/08/2017	30/08/2017		Alejandro,Caio,João,Tiago,Victor e Vinicius		11.200,00
1.1	Formação do Grupo	1 Dia	24/07/2017	24/08/2017	24/08/2017		Alejandro,Caio,João,Tiago,Victor e Vinicius	_	51.400,00
1.2	Análise de escopo	2 Dias	28/08/2017	30/08/2017	30/08/2017		Alejandro,Caio,João,Tiago,Victor e Vinicius		2.800,00
1.1.2	Levantamento de requisitos	1 Dia	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017		Alejandro,Caio,João,Tiago,Victor e Vinicius	_	1.400,00
1.1.3	Entend im ento do escopo	1 Dia	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017		Alejandro,Caio,João,Tiago,Victor e Vinicius		51.400,00
1.3	Canvas	5 Dias	24/08/2017	30/08/2017	30/08/2017		Alejandro,Caio,João,Tiago,Victor e Vinicius	RS	7.000,00
2	Pla ne jam en to	9 Dias	29/08/2017	15/09/2017	15/09/2017			_	55.240,00
2.1	Reunião com o Cliente	1 Dia	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017		Alejandro,Caio,João,Tiago,Victor e Vinicius	R\$	1.400,00
2.2	Desenvolvimento do Cronograma	1 Dia	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017		Caio	R\$	280,00
2.3	Desenvolvimento do EAP	1 Dia	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017		Caio e Vinicius	R\$	520,00
2.4	Desenvolvimento do relatório de progresso	1 Dia	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017		Caio	R\$	280,00
2.5	Analise de Risco	1 Dia	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017		Caio	R\$	280,00
2.6	Analise de Stakeholders	1 Dia	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017		João e Tiago	R\$	480,00
2.7	Analise de Custos	1 Dia	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017		Caio	R\$	280,00
2.8	Requesitos Funcionais e Não funcionais	1 Dia	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017		Caio	R\$	280,00
2.9	Narrativa de casos de usos	3 Dias	13/09/2017	15/09/2017	15/09/2017		Tiago e Vinicius	R\$	1.440,00
3	Execução	54 Dias	30/08/2017	16/10/2017	16/10/2017			R\$	26.360,00
3.1	Prototipo do Banco	1 Dia	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017		João, Tiago, Vinicius	R\$	720,00
3.2	Nivelamento linguagem C	7 Dias	04/09/2017	12/09/2017	12/09/2017		Vinicius,Tiago e João	R\$	5.040,00
3.3	Definir Materiais	7 Dias	31/08/2017	08/09/2017	08/09/2017		Alejandro,Caio,João,Tiago,Victor e Vinicius	R\$	9.800,00
3.4	Adquirir Materiais	30 dias	04/09/2017	13/10/2017	13/10/2017	3.3	Cliente	R\$	-
3.5	Montagem do dispositivo	15 Dias	26/09/2017	16/10/2017	16/10/2017	3.4	Vinicius,Tiago e João	R\$	10.800,00
4	Desenvolvimento Back-End	12 Dias	13/09/2017	19/10/2017	19/10/2017				15.680,00
4.1	Modelagem do Banco	2 Dias	13/09/2017	14/09/2017	12/09/2017	3.1	João, Tiago, Vinicius e Caio	R\$	2.000,00
4.2	Cadastro	2 Dias	14/09/2017	15/09/2017	15/09/2017		Vinicius,Tiago e João	R\$	4.320,00
4.2.1	Cadastro de Produto	2 Dias	14/09/2017	15/09/2017	15/09/2017		Vinicius,Tiago e João	R\$	1.440,00
4.2.2	Cadastro de Movimento	2 Dias	14/09/2017	15/09/2017	15/09/2017		Vinicius,Tiago e João	R\$	1.440,00
4.2.3	Cadastro de Distribuido r	2 Dias	14/09/2017	15/09/2017	15/09/2017		Vinicius,Tiago e João	R\$	1.440,00
4.3	Listar	4 Dias	15/09/2017	18/09/2017	15/09/2017		Vinicius,Tiago e João	R\$	5.040,00
4.3.1	Listar Produto	3 Dias	15/09/2017	18/09/2017	15/09/2017	4.2.1	Vinicius,Tiago e João	R\$	2.160,00
4.3.2	Lista de Movimento	1 Dia	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	4.2.2	Vinicius,Tiago e João	R\$	720,00
4.3.3	Listar Distribuidor	3 Dias	15/09/2017	18/09/2017	15/09/2017	4.2.3	Vinicius,Tiago e João	R\$	2.160,00
4.4	Excluir	1 Dia	15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	41213	Vinicius,Tiago e João	R\$	2.160,00
4.4.1	Excluir Distribuidor	1 Dia	15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	4.2.3	Vinicius,Tiago e João	R\$	720,00
4.4.1	Excluir Movimento	1 Dia	15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	4.2.2	Vinicius,Tiago e João	R\$	720,00
4.4.1	Excluir Produto	1 Dia	15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	4.2.1	Vinicius,Tiago e João	R\$	720,00
4.7	Testes	3 Dias	17/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	41211	Vinicius,Tiago e João	R\$	2.160,00
5	Desenvolvimento Front-End	17 Dias	04/09/2017	22/09/2017	22/09/2017		Villicius, mago e Joao		57.600,00
5.1	Nivelamento de Desktop	7 Dias	04/09/2017	12/09/2017	12/09/2017		Alejandro e Victor	R\$	2.800,00
5.2	Telas	10 Dias	18/09/2017	22/09/2017	22/09/2017		Alejandro e Victor	R\$	4.800,00
5.2.1	Tela de Menu	1 Dia					Alejandro e Victor	R\$	400,00
			18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017				
5.2.2	Cadastro de Produtos	2 Dias	19/09/2017	20/09/2017	20/09/2017		Alejandro e Victor	R\$	800,00
5.2.3	Cadastro de Movimento	2 Dias	25/09/2017	26/09/2017	26/09/2017		Alejandro e Victor	R\$	800,00
5.2.4	Cadastro de Distribuido r	2 Dias	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017		Alejandro e Victor	R\$	800,00
5.2.6	Listar Produtos	2 Dias	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017		Alejandro e Victor	R\$	800,00
5.2.7	Lista de Movimento	2 Dias	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017		Alejandro e Victor	R\$	800,00
5.2.8	Lista de Distribuidor	1 Dia	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017		Alejandro e Victor	R\$	400,00
6	Integração	63 Dias	04/10/2017	27/11/2017				_	30.800,00
6.2	Integração Back-End e Front-End	23 Dias	04/10/2017	03/11/2017			Alejandro e Victor	R\$	9.200,00
6.1	Integração do RFID	30 Dias	17/10/2017	27/11/2017		3.5	João, Tiago, Vinicius	R\$	21.600,00
7	Finalização	16 Dias	27/10/2017	15/12/2017				_	17.200,00
7.1	Teste Geral	7 Dias	27/11/2017	05/12/2017		4.7	Alejan dro, João, Tiago, Victor e Vinicius	R\$	7.840,00
7.2	Desenvolvimento da Apresentação	6 Dias	01/12/2017	08/12/2017			Caio, João e Vinicius	R\$	6.240,00
7.3	Apresentação	3 Dias	13/12/2017	15/12/2017			Caio, João e Vinicius	R\$	3.120,00

10. **EAP**

10.1 EAP GERAL



10.2 EAP DETALHADO

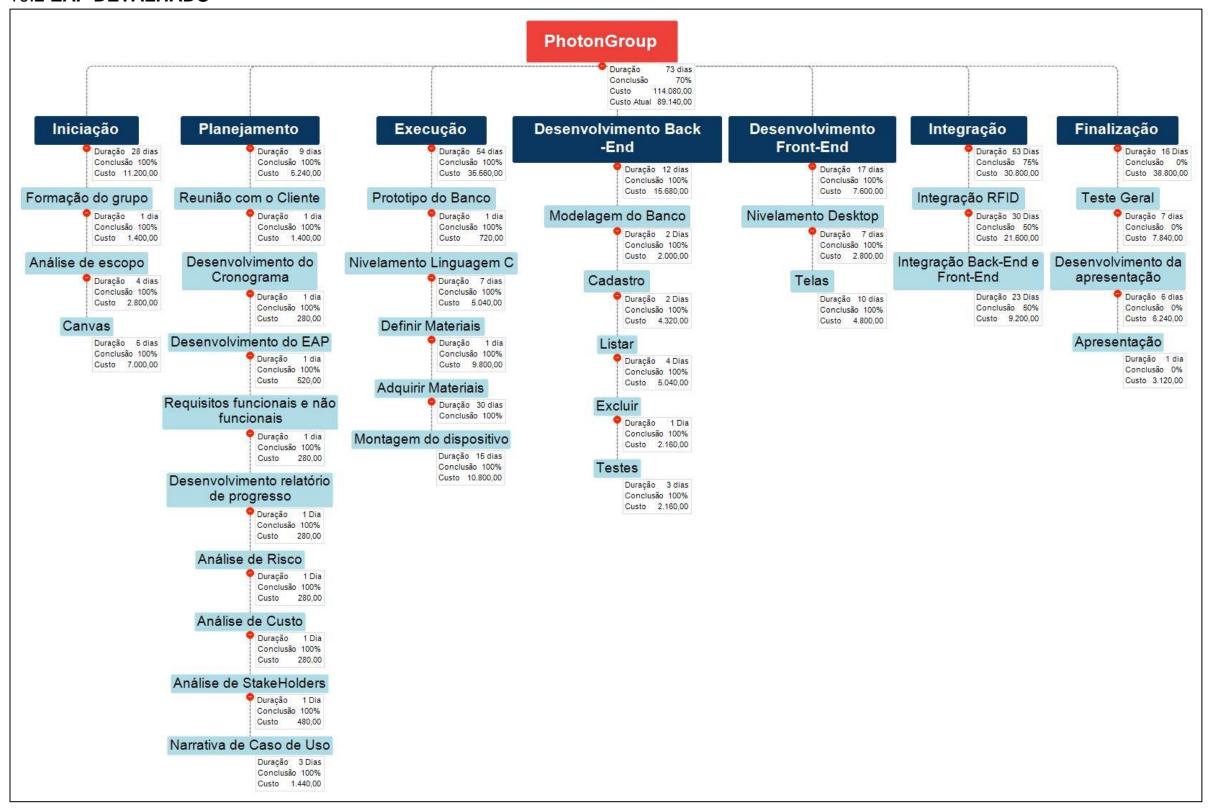


10.3 EAP GERAL - AGOSTO




10.4 RELATORIO DE PROGRESSO AGOSTO

			Relatorio de prog	gresso de Agosto						
	Informações gerais									
Projeto Photon Group Andamento do projeto % 3										
Inicio	15/08/2017	Conclusão	31/08/2017	Gasto	R\$	13.244,30				
	Entregas									
ID	Descrição	Inicio	Conclusão	Conclusão Real	Status	Responsável				
	Problemas Encontrados									

10.5 EAP DETALHADO - AGOSTO

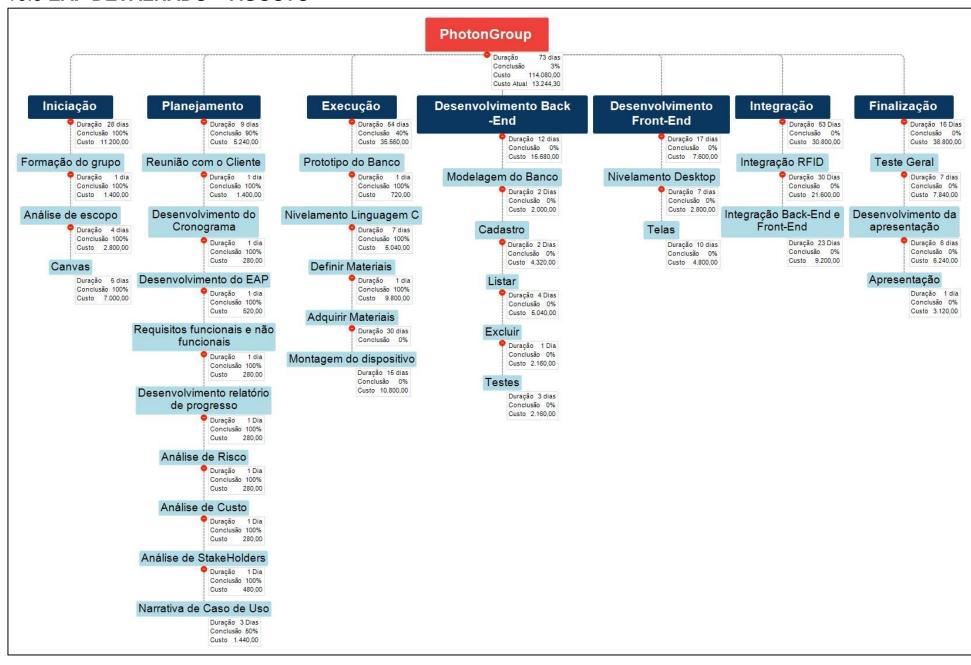


10.6 EAP GERAL – SETEMBRO



10.7 RELATORIO DE PROGRESSO SETEMBRO

Relatorio de progresso de Setembro									
Informações gerais									
o % 45									
R\$ 19.553,30									
Entregas									
Status Responsável									
Concluido Vinicius, Tiago e João									
Concluido Vinicius, Tiago e João									
Problemas Encontrados									
Concluido Vinici									


10.8 EAP DETALHADO - SETEMBRO

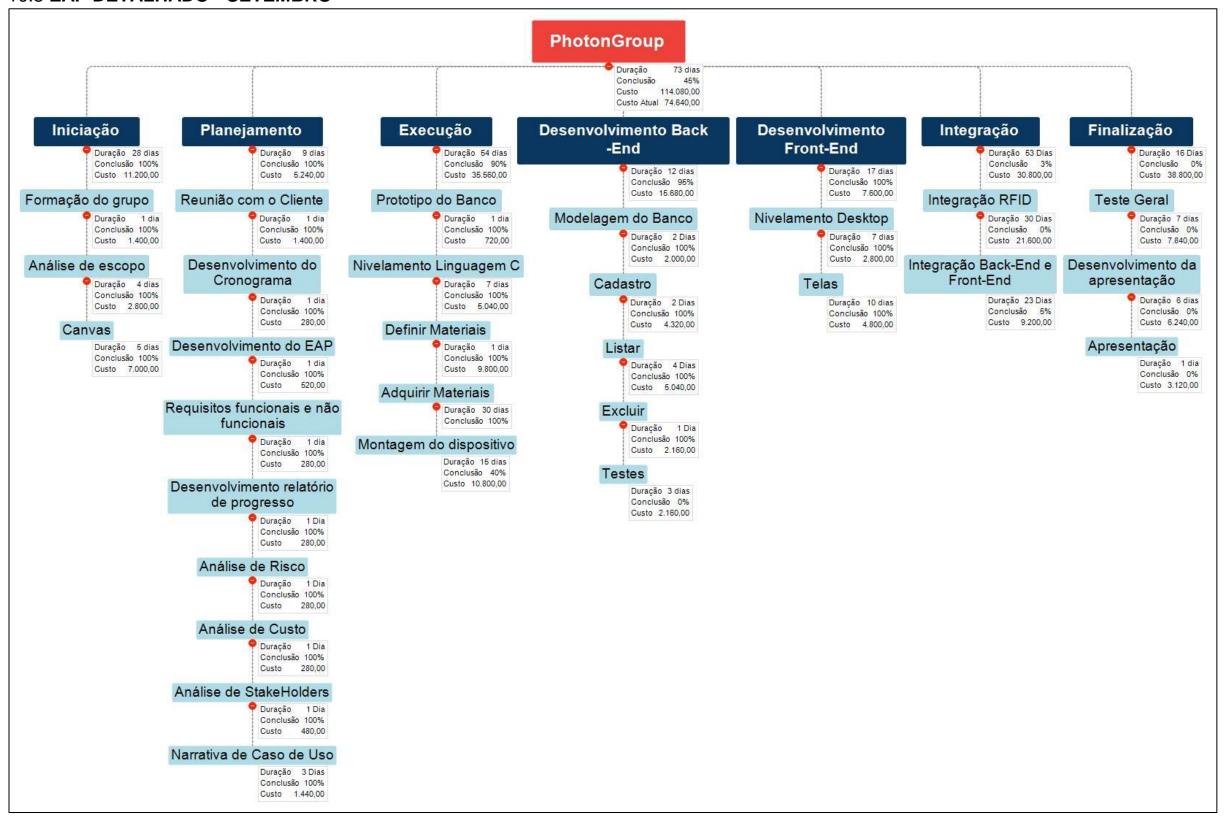

10.9 EAP GERAL - OUTUBRO




10.10 EAP DETALHADO - OUTUBRO

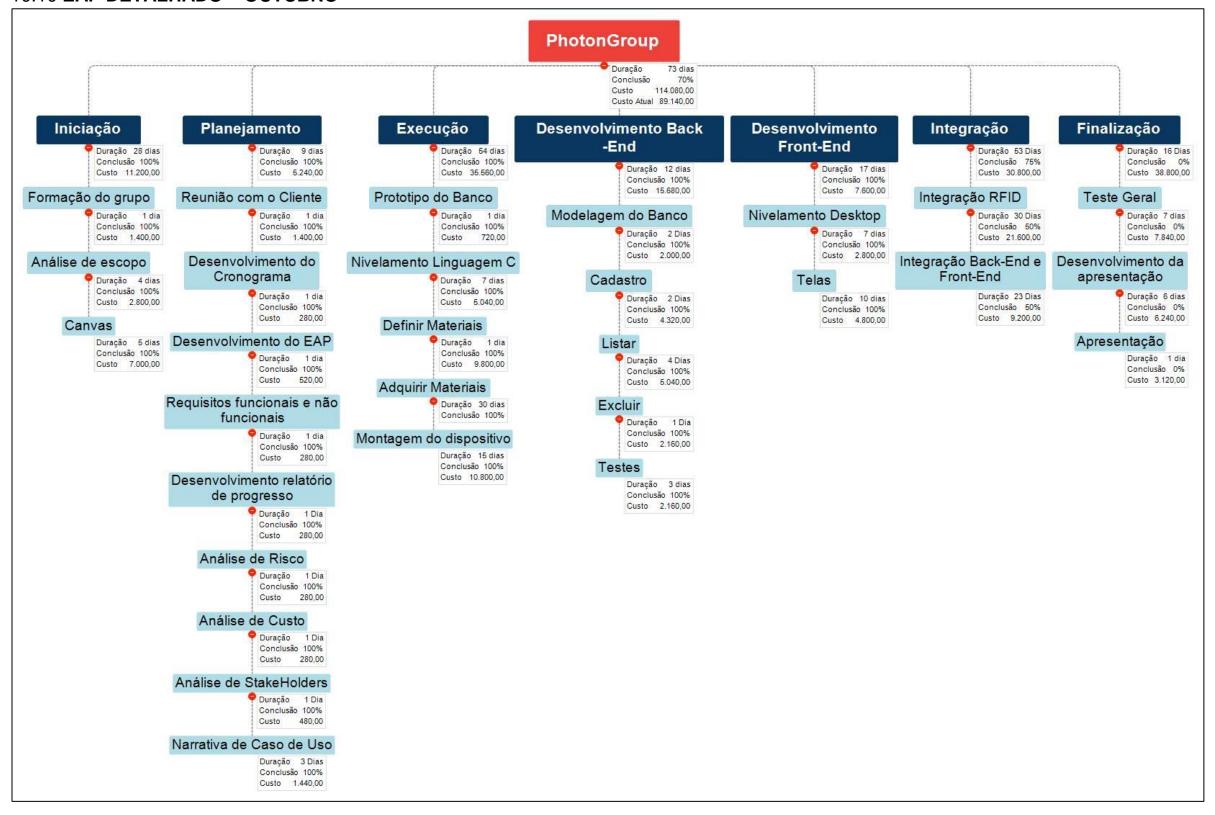


11. RELATORIO DE FREQUÊNCIA

	1º Semana	2º Semana	3º Semana	4º Semana	5º Semana	6º Semana	7º Semana	8º Semana	9º Semana	10º Semana	11º Semana	12º Semana	13º Semana
Alejandro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	80%	100%
Caio	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	100%
João Vitor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%
Tiago	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	80%	80%	80%
Victor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
Vinicius	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	100%	100%

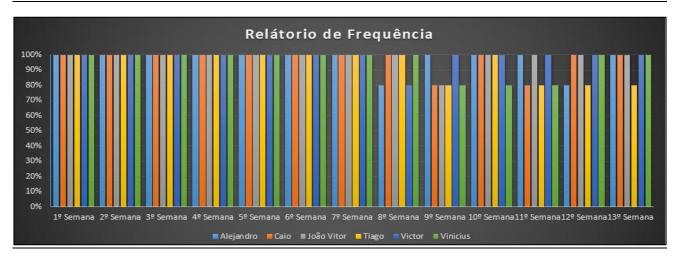

12. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**

12.1 CASO DE USO

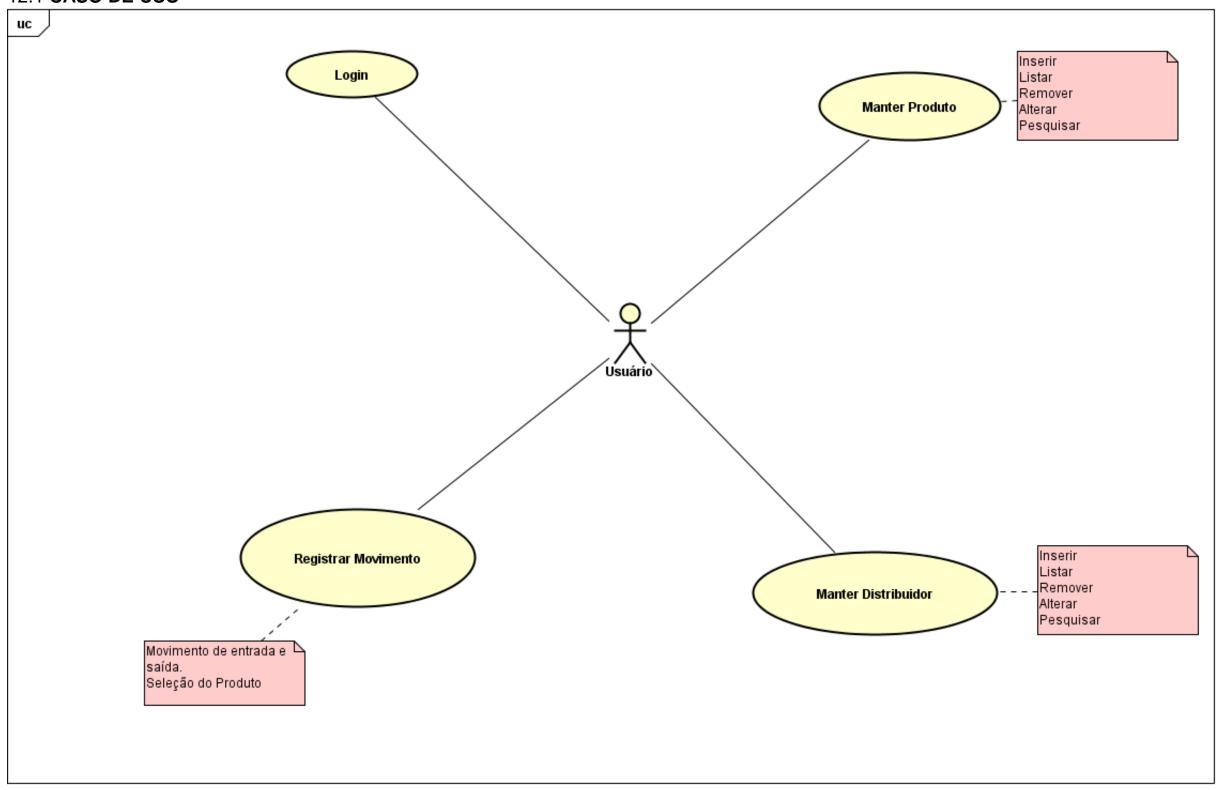

12.2 NARRATIVA DE CASO DE USO

12.2.1 **CSU01/CADASTRAR**

Narrativa de Caso de Uso

Sigla/Nome: PCU - Cadastro de Produto

Objetivo: Cadastrar os Produtos

Atores: Usuário

CENÁRIO PRINCIPAL

- O Caso de uso inicia quando o usuário seleciona a opção Cadastrar Produto.
- 2. O usuário preenche o campo com o nome do produto.
- 3. O sistema verifica e valida o campo se está preenchido corretamente.
- 4. O sistema verifica se o produto já está cadastrado.
- O sistema cadastra o produto.

CENÁRIOS ALTERNATIVOS

Não há.

CENÁRIOS DE EXECUÇÃO

3.1. Campo obrigatório e preenchido incorretamente.

 a) Caso o campo esteja preenchido incorretamente ou n\u00e3o preenchido, o sistema reporta ao usu\u00e1rio e retorna ao passo 2.

PRÉ-CONDIÇÕES

Não há.

PÓS-CONDIÇÕES

12.2.2 CSU02/LISTAPRODUTO

Narrativa de Caso de Uso

Sigla/Nome: PCU – Lista de Produto Objetivo: Listar todos os produtos

Atores: Usuário

CENÁRIO PRINCIPAL

- 1. O Caso de uso inicia quando o usuário seleciona a opção Listar Produtos.
- 2. O sistema exibe a lista com todos os produtos.

CENÁRIOS ALTERNATIVOS

- 1. Excluir Produto
- 2. Alterar Produto
- 3. Pesquisar Produto

CENÁRIOS DE EXECUÇÃO

2.1. Listagem

a) Ordem Crescente.

PRÉ-CONDIÇÕES

1.1. Deve ter no mínimo 1 produto cadastrado.

PÓS-CONDIÇÕES

12.2.3 CSU03/LISTADISTRIBUIDOR

Narrativa de Caso de Uso

Sigla/Nome: PCU – Lista de Distribuidor Objetivo: Listar todos os distribuidores

Atores: Usuário

CENÀRIO PRINCIPAL

- 1. O Caso de uso inicia quando o usuário seleciona a opção Listar Distribuidores.
- 2. O sistema exibe a lista com todos os distribuidores.

CENÁRIOS ALTERNATIVOS

- 1. Excluir Distribuidor
- Alterar Distribuidor
- 3. Pesquisar Distribuidor

CENÁRIOS DE EXECUÇÃO

1.1. Listagem

a) Ordem Crescente.

PRÉ-CONDIÇÕES

1.1. Deve ter no mínimo 1 distribuidor cadastrado.

PÓS-CONDIÇÕES

12.2.4 CSU04/ALTERARDISTRIBUIDOR

Narrativa de Caso de Uso

Sigla/Nome: PCU – Alterar Distribuidor **Objetivo:** Alterar distribuidores cadastrados

Atores: Usuário

CENÁRIO PRINCIPAL

- 1. O Caso de uso inicia quando o usuário seleciona a opção Alterar Distribuidor.
- 2. O sistema exibe o campo com o nome do distribuidor.
- 3. O usuário altera o nome do distribuidor.
- 4. O usuário clica no botão Alterar.
- 5. O sistema altera o nome do distribuidor.

CENÁRIOS ALTERNATIVOS

2.1. O usuário pode cancelar o processo.

CENÁRIOS DE EXECUÇÃO

Não há.

PRÉ-CONDIÇÕES

1.1. Deve ter pelo menos 1 distribuidor cadastrado

PÓS-CONDIÇÕES

12.2.5 CSU05/ALTERARPRODUTO

Narrativa de Caso de Uso

Sigla/Nome: PCU – Alterar Produto
Objetivo: Alterar produtos cadastrados

Atores: Usuário

CENÁRIO PRINCIPAL

- 1. O Caso de uso inicia quando o usuário seleciona a opção Alterar Produto.
- 2. O sistema exibe o campo com o nome do produto.
- 3. O usuário altera o nome do produto.
- 4. O usuário clica no botão Alterar.
- 5. O sistema altera o nome do produto.

CENÁRIOS ALTERNATIVOS

2.1. O usuário pode cancelar o processo.

CENÁRIOS DE EXECUÇÃO

Não há.

PRÉ-CONDIÇÕES

1.1. Deve ter pelo menos 1 produto cadastrado.

PÓS-CONDIÇÕES

12.2.6 CSU06/CADASTRODISTRIBUIDOR

Narrativa de Caso de Uso

Sigla/Nome: PCU - Cadastro de Distribuidor

Objetivo: Cadastrar os Distribuidores

Atores: Usuário

CENÁRIO PRINCIPAL

- 1. O Caso de uso inicia quando o usuário seleciona a opção Cadastrar Distribuidor.
- 2. O usuário preenche o campo com o nome do distribuidor.
- 3. O sistema verifica e valida o campo se está preenchido corretamente.
- 4. O sistema verifica se o distribuidor já está cadastrado.
- 5. O sistema cadastra o distribuidor.

CENÁRIOS ALTERNATIVOS

Não há.

CENÁRIOS DE EXECUÇÃO

3.1. Campo obrigatório e preenchido incorretamente.

 b) Caso o campo esteja preenchido incorretamente ou n\u00e3o preenchido, o sistema reporta ao usu\u00e1rio e retorna ao passo 2.

PRÉ-CONDIÇÕES

Não há.

PÓS-CONDIÇÕES

12.2.7 CSU07/EXCLUIRDISTRIBUIDOR

Narrativa de Caso de Uso						
Sigla/Nome: PCU – Excluir Distribuidor						
Objetivo: Excluir distribuidores cadastrados						
Atores: Usuário						
CENÁRIO PRINCIPAL						
 O Caso de uso inicia quando o usuário seleciona a opção Excluir Distribuidor. O sistema excluir o distribuidor escolhido. 						
CENÁRIOS ALTERNATIVOS						
Não há.						
CENÁRIOS DE EXECUÇÃO						
Não há.						
PRÉ-CONDIÇÕES						
1.1. Deve ter pelo menos 1 distribuidor cadastrado.						
PÓS-CONDIÇÕES						
Não há.						

12.2.8 CSU08/EXCLUIRPRODUTO

Narrativa de Caso de Uso

Sigla/Nome: PCU – Excluir Produto **Objetivo:** Excluir produtos cadastrados

Atores: Usuário

CENÁRIO PRINCIPAL

1. O Caso de uso inicia quando o usuário seleciona a opção Excluir Produto.

2. O sistema excluir o produto escolhido.

CENÁRIOS ALTERNATIVOS

Não há.

CENÁRIOS DE EXECUÇÃO

Não há.

PRÉ-CONDIÇÕES

1.1. Deve ter pelo menos 1 produto cadastrado.

PÓS-CONDIÇÕES

12.2.9 CSU09/PESQUISARPRODUTO

Narrativa de Caso de Uso

Sigla/Nome: PCU – Pesquisar Produto
Objetivo: Pesquisar produtos cadastrados

Atores: Usuário

CENÁRIO PRINCIPAL

- O Caso de uso se inicia quando o usuário da entrada em uma pesquisa no campo de pesquisa de Produto.
- O usuário clica no botão Pesquisar
- 3. O sistema pesquisa pelo produto escolhido.

CENÁRIOS ALTERNATIVOS

Não há.

CENÁRIOS DE EXECUÇÃO

2.1. O campo deve estar preenchido para efetuar a pesquisa.

PRÉ-CONDIÇÕES

1.1. O usuário deve estar na tela de Lista de Produtos.

PÓS-CONDIÇÕES

12.2.10 CSU10/PESQUISARDISTRIBUIDOR

Narrativa de Caso de Uso

Sigla/Nome: PCU – Pesquisar Distribuidor **Objetivo:** Pesquisar distribuidores cadastrados

Atores: Usuário

CENÁRIO PRINCIPAL

- O Caso de uso se inicia quando o usuário da entrada em uma pesquisa no campo de pesquisa de Distribuidores.
- 2. O usuário clica no botão Pesquisar.
- 3. O sistema busca pelo distribuidor escolhido.

CENÁRIOS ALTERNATIVOS

Não há.

CENÁRIOS DE EXECUÇÃO

2.1. O campo deve estar preenchido para efetuar a pesquisa.

PRÉ-CONDIÇÕES

1.1. O usuário deve estar na tela de Lista de Distribuidores

PÓS-CONDIÇÕES

12.2.11 CSU11/REGISTRARMOVIMENTO

Narrativa de Caso de Uso

Sigla/Nome: PCU – Registrar Movimento

Objetivo: Registrar movimentos de entrada e saída

Atores: Usuário

CENÁRIO PRINCIPAL

- 1. O Caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção Registrar Movimento.
- 2. O sistema exibe uma tela com campos a serem preenchidos.
- 3. O usuário preenche os campos.
- 4. O usuário escolhe o produto, dentre os cadastrados.
- O usuário escolhe o distribuidor, dentre os cadastrados, caso seja um movimento de saída.
- 6. O usuário passa os produtos com rfid no leitor.
- 7. Um campo exibirá a quantidade de produtos que foram lidos.
- 8. O usuário clica no botão de cadastrar.
- 9. O sistema Registra Movimento.

CENÁRIOS ALTERNATIVOS

- 4.1. Caso não haver algum produto cadastrado, o usuário poderá ter acesso ao Cadastro de Produto pelo menu.
- 5.1. Caso n\u00e3o haver algum distribuidor cadastrado, o usu\u00e1rio poder\u00e1 ter acesso ao Cadastro de Distribuidor pelo menu.

CENÁRIOS DE EXECUÇÃO


- 4.1.1. Deve selecionar um produto.
- 5.1.1. Deve selecionar um distribuidor.
- 8.1. Todos os campos devem estar preenchidos.

PRE-	\cap N	IDIC	OFS
I IVE	COI	DI,	, OLJ


Não há.

PÓS-CONDIÇÕES

12.3 MER(MODELO ENTIDADE DE RELACIONAMENTO)

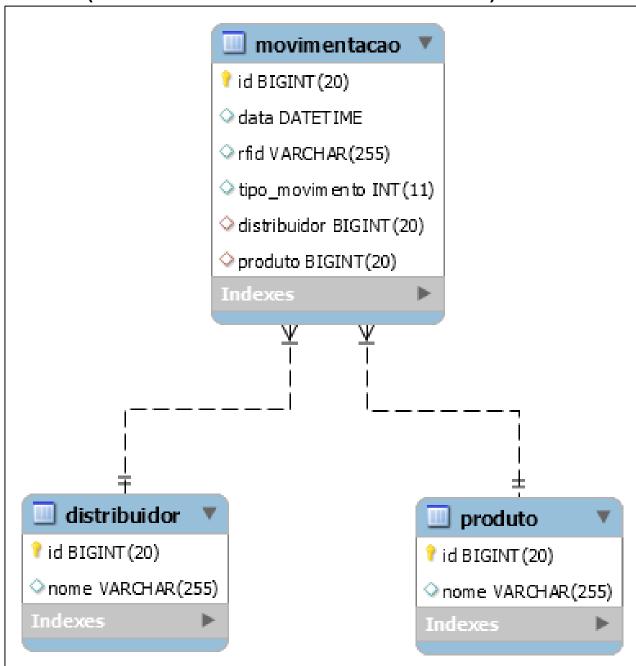


12.4 DIAGRAMA DE CLASSE

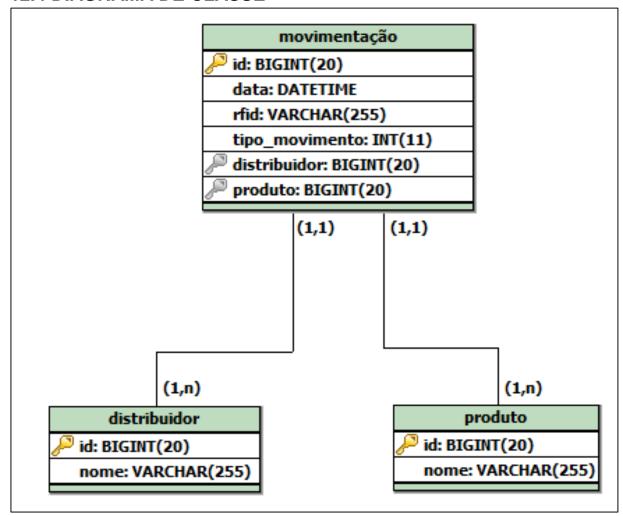


ANEXOS


ANEXO I -PROTÓTIPO CADASTRO DE DISTRIBUIDOR




ANEXO II -PROTÓTIPO CADASTRO DE MOVIMENTO

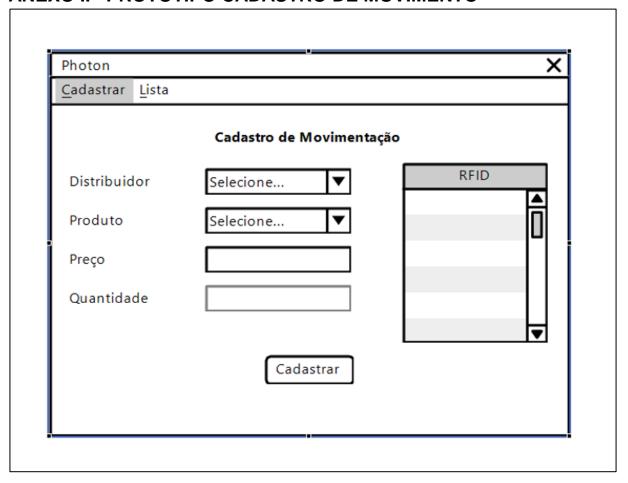


ANEXO III -PROTÓTIPO CADASTRO DE PRODUTO




ANEXO IV -PROTÓTIPO LISTA DE MOVIMENTAÇÃO



ANEXO V -PROTÓTIPO LISTA DE DISTRIBUIDOR



ANEXO VI -PROTÓTIPO LISTA DE PRODUTO



ANEXO VIII -PROTÓTIPO TELA INICIAL

